

CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

OPERE DI PRONTO INTERVENTO

Lavori di pronto intervento per disaggio materiale roccioso pericolante in loc. Badia Prataglia in Comune di Poppi.

VERBALE DI SOMMA URGENZA (Art. 163 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50)

A seguito di segnalazione da parte del Comune di Poppi, è stato effettuato in data 01/10/2020 dai tecnici dell'Ente un sopralluogo, in loc. Badia Prataglia in Comune di Poppi, per una prima valutazione tecnica relativa alla caduta di un masso sulla sottostante viabilità provinciale. Da un primo esame il masso, di cui si allegano foto, è rotolato per circa 60 metri sul pendio a monte della strada e deviato da un cartello verticale di segnaletica stradale ha danneggiato la staccionata a valle, fermandosi 7 metri dopo sul prato erboso.

Il masso sembra provenire da un impluvio delimitato in destra e sinistra da due affioramenti rocciosi di macigno alternato a strati di argille scagliose. Data l'elevatissima pendenza è stato impossibile raggiungere la nicchia di distacco.

La gravità della situazione richiede un primo urgente intervento di disaggio di altro materiale roccioso pericolante presente, da effettuarsi mediante l'ausilio di una ditta specializzata, da contattare nel più breve tempo possibile.

Dopo tale operazione si dovranno valutare ulteriori interventi per la messa in sicurezza definitiva della zona.

Considerato quanto sopra, i sottoscritti Geom. Carlo Rossi e Dott. For. Lucio Lasagni, dipendenti dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino giunti per primi nei luoghi descritti

DICHIARANO

che i lavori di pronto intervento per la realizzazione dei lavori sopra riportati, rivestono carattere di urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs del 18 Aprile 2016 n° 50

Poppi 02/10/2020

I TECNICI

Geom. Carlo Rossi

Dott. For. Lucio Lasagni



CASTEL
FOCOGNANO



CASTEL
SAN
NICCOLO'



CHITIGNANO



CHIUSI
DELLA
VERNA



MONTEMIGNANO



ORTIGNANO
RAGGIOLO



POPPI



TALLA

PERIZIA SOMMARIA

Lavori di pronto intervento per disgregazione materiale roccioso pericolante in loc. Badia Prataglia in Comune di Poppi.

Intervento 1)

Designazione dei lavori	U.M.	Quantità	P.U. €	Importo €
Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, disgregazione di massi eseguito da personale specializzato mediante l'uso di palanchini e martinetti idraulici	Mq.	1.000	18,00	18.000,00
TOTALE				18.000,00

I Tecnici

Geom. Carlo Rossi

Dott. For. Lucio Lasagni

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Masso caduto



**Danni alla
staccionata**



Affioramenti rocciosi

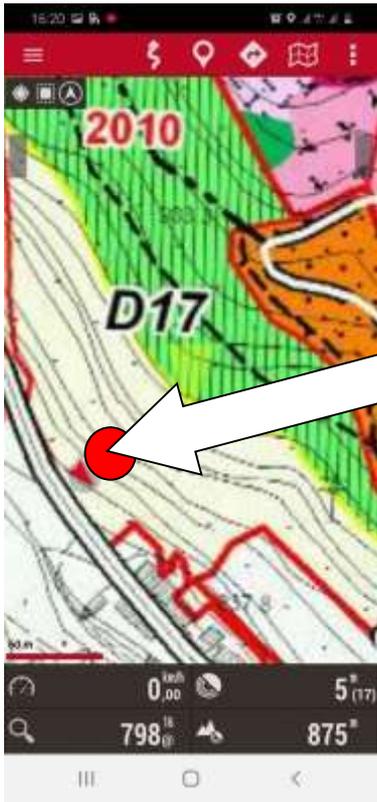

Localizzazione affioramenti rocciosi

